

営繕工事における「週休2日」試行工事实施要領

1. 目的

本実施要領は、鹿児島県が所管する営繕工事において、「週休2日」試行工事を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

2. 用語の定義

(1) 週休2日

対象期間において、4週6休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

(4) 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(5) 4週6休以上

対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が、21.4%（6日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所の日数に含めるものとする。

3. 対象工事

対象工事は、営繕工事のうち次のいずれにも該当しない工事とする。

- (1) 災害復旧工事を含む緊急性のある工事
- (2) その他休日の確保が困難であると判断される工事

4. 発注方式

受注者希望方式を（受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式）を基本とする。

5. 積算方法等

(1) 補正方法

建設業全体で週休2日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4週8休以上の現場閉所（現場休息）による週休2日の取得を目指しつつも、週休2日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、受注者希望方式においては、4週6休以上の現場閉所（現場休息）について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休2日の実現に取り組むこととする。

週休2日促進工事において、以下の①から③までの現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する。

① 4週8休以上

（現場閉所（現場休息）率28.5%（8日/28日）以上）

1.05

② 4週7休以上4週8休未満

（現場閉所（現場休息）率25%（7日/28日）以上28.5%未満）

1.03

③ 4週6休以上4週7休未満

（現場閉所（現場休息）率21.4%（6日/28日）以上25%未満）

1.01

(2) 積算及び変更方法

現場閉所（現場休息）の状況を確認後、(1)①から③までの現場閉所（現場休息）の状況に応じて、労務費を補正し工事費を積算し、契約書第25条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、4週6休に満たないもの及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む）については、変更の対象としない。

6. 対象工事である旨等の明示

対象工事である旨等の明示は、現場説明書への記載により行うものとする。

7. 現場閉所（現場休息）の確認方法等

(1) 現場閉所（現場休息）の確認方法

① 工事着手前

- ・ 受注者は、契約後、施工計画書の提出前に週休2日試行工事の実施の意向について、工事打合簿により発注者に速やかに報告し、実施の有無を決定する。
- ・ 監督員は、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「休日取得計画表」（以下、計

画表) という) を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。

- ・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで計画表を作成する。

② 工事着手後

- ・監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した計画表を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、計画表の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
- ・監督員は、受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された計画表により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
- ・受注者は、監督員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため計画表に現場閉所(現場休息)の日を記載し、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)と併せて、監督員に提出する。

③ その他留意事項

- ・現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・監督員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)の日に作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ・監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。
- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。
- ・監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、計画表を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

(2) 週休2日促進工事の見える化

施設管理者の承諾を前提に週休2日試行工事である旨を仮囲い等に明示する。


附則

1. 本要領は、令和3年4月1日から試行する。

(参考資料 1)

7 (2) 関係

週休 2 日 試行工事である旨の明示例 (現場表示板での明示)

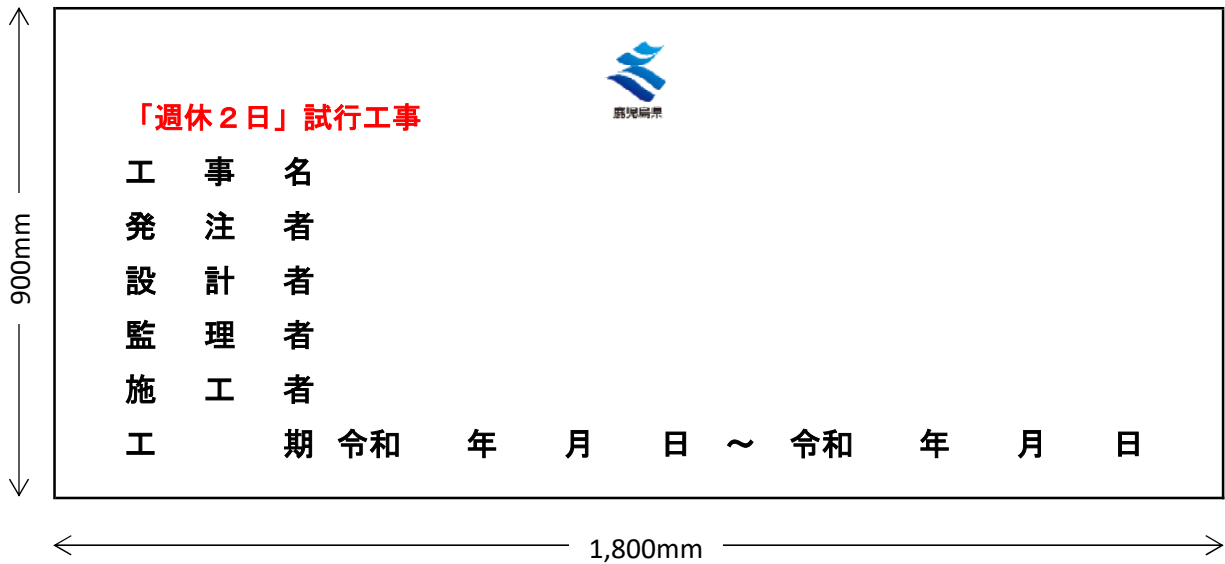

休日取得計画表

【記入例】

工事名 : ○○○○工事(○○○○2-○工区)
工事着手日 : 令和1年7月22日
工事完成届出日(予定) : 令和2年3月27日
工事期間 : 250日間

Table with 3 columns: 対象期間, 閉所日数, 閉所率. Rows: 計画 (238, 67, 28.2%), 実績 (238, 54, 22.7%).

Table with 2 columns: 休日相当, 残数. Rows: 28.5%以上:4週8休 (14), 25.0%以上:4週7休 (6), 21.4%以上:4週6休 (-3).

Calendar grid for July 2021. Includes callouts: ①工事名, 工事着手日, 工事完成届出日(予定)を入力します. ※カレンダーが自動入力されます. ③夏季休暇, 年末年始休暇, 工事中止をプルダウンリストから選択し, 入力します. ⑥現場閉所率が自動計算されます. ⑦各閉所率に対する残り休日数が表示されます. ※休日計画の目安に使用してください.

Calendar grid for August 2021. Includes callouts: ④予定している休日を計画欄に入力します. ⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します. ※雨による休日もプルダウンリストから選択します.

Calendar grid for September 2021. Includes summary table: 2, 休暇等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 9, 現場閉所率 32.1%.

Calendar grid for October 2021. Includes summary table: 3, 休暇等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 6, 現場閉所率 21.4%.

Calendar grid for November 2021. Includes summary table: 4, 休暇等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 5, 現場閉所率 17.9%.

Calendar grid for December 2021. Includes summary table: 5, 休暇等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 6, 現場閉所率 21.4%.

Calendar grid for January 2022. Includes summary table: 6, 休暇等 6, 対象期間 22, 計画日数 7, 計画率 31.8%, 閉所日数 4, 現場閉所率 18.2%.

Calendar grid for February 2022. Includes callout: ②工事完成届出日以降は消去します. Includes summary table: 7, 休暇等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 5, 現場閉所率 17.9%.

Calendar grid for March 2022. Includes summary table: 8, 休暇等 0, 対象期間 25, 計画日数 6, 計画率 24.0%, 閉所日数 3, 現場閉所率 12.0%.
